

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
(представляется ежеквартально) I квартал 2016 года**

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток по результатам отчета по состоянию на конец отчетного периода*	ман. рублей	%	Отклонение от программы		
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		Освоено (завыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток по результатам отчета по состоянию на конец отчетного периода*							
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт										
<b>1.</b>	<b>ВСЕГО,</b>	<b>64.201</b>	<b>22.990</b>	<b>0.272</b>	<b>0.259</b>	<b>0.272</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.272</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.272</b>	<b>0.272</b>	<b>0.272</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция энергосбережения и повышение энергетической эффективности</b>	<b>50.146</b>	<b>20.379</b>	<b>0.272</b>	<b>0.259</b>	<b>0.272</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.272</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.272</b>	<b>0.272</b>	<b>0.272</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>Электрические линии</b>	<b>6.767</b>	<b>0.802</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.802</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
<b>1.1.1.1.</b>	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПК 220/110/10 кВ "Рузавка" до ПП-32 п. Химмаш	1.701	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.2.</b>	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"	5.066	0.802	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.802	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.3.</b>	<b>Подстанции</b>	<b>36.166</b>	<b>15.259</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>4.420</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>10.839</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
<b>1.1.1.3.1.</b>	Уровень входного напряжения 110 кВ (ВН) ГПП 110/10 кВ "ДАД"	35.564	15.259	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.420	0.000	0.000	0.000	0.000	10.839	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.3.2.</b>	Замена выключателей МКП-110 - 5 шт	17.274	9.740	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.420	0.000	0.000	0.000	0.000	5.320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.3.3.</b>	Замена выключателей МКП-110 - 5 шт	11.954	4.420	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.420	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.3.4.</b>	Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт.	4.070	4.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.3.5.</b>	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт	1.250	1.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.3.6.</b>	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт	18.290	5.519	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.519	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.3.7.</b>	Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключателя 110 кВ - 2 шт.	5.402	1.801	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.801	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.3.8.</b>	Замена КРУН-10	11.153	3.718	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.718	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.3.9.</b>	Замена ВЧ заградителей - 4 шт.	0.669	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.3.10.</b>	Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт.	0.875	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.1.3.11.</b>	Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт.	0.191	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.1.2.</b>	<b>Уровень входного напряжения 1-20 кВ (СН2)</b>	<b>0.602</b>	<b>0.602</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
<b>1.1.2.1.</b>	Замена ПП-3301	0.602	0.602	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.4.</b>	<b>Оснащение электроустановок, светотехникой и приборами</b>	<b>2.178</b>	<b>1.036</b>	<b>0.272</b>	<b>0.259</b>	<b>0.272</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.259</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.259</b>	<b>0.272</b>	<b>0.272</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
<b>1.4.1.</b>	Приобретение ЭТЛ	2.178	1.036	0.272	0.259	0.272	0.000	0.000	0.259	0.000	0.000	0.000	0.000	0.259	0.272	0.272	0.000	0.000	0.000	
<b>1.5.</b>	<b>Создание систем противоаварийной и режимной защиты</b>	<b>5.035</b>	<b>3.282</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
<b>1.5.1.</b>	<b>Внедрение микропроцессорной релейной защиты, автоматика на ГПП 110/10 кВ "ДАД"</b>	<b>4.448</b>	<b>3.282</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
<b>1.5.1.1.</b>	Замена панелей защит 1636 и 1643 по 23 шт с ВЧ передатчиками	2.332	1.166	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.166	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.5.1.2.</b>	Замена панелей защит силовых трансформаторов-2 шт.	0.587	0.587	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.587	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.5.1.3.</b>	Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ-1 шт	0.246	0.246	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.246	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.5.1.4.</b>	Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт.	0.425	0.425	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.425	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.5.1.5.</b>	Замена панели центральной сигнализации - 1 шт.	0.367	0.367	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.367	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.5.1.6.</b>	Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт.	0.491	0.491	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.491	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.5.2.</b>	<b>Внедрение микропроцессорной релейной защиты, автоматика на ГПП 110/10 кВ "Висмут"</b>	<b>0.587</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
<b>1.5.2.1.</b>	Замена панелей защит силовых трансформаторов-2 шт.	0.587	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>1.6.</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>																			
<b>1.7.</b>	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>																			

Приложение № 7.1  
к приказу Министра России  
от 24 марта 2016 г. № 114

Утверждено  
Генеральный директор  
АО "Муромский энергетический  
объект" А.А. Голинов  
2016 г.  
М.П.

М.П.





**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) I квартал 2016 года**

№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.*				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто) актами выполненных работ), млн. руб.				Генеральные объекты				Технические характеристики сооружений объектов					
		Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет
1	ВСЕГО	0,259	0,000	0,000	0,000	0,272	0,000	0,000	0,000	-0,013	0,000	0,000	0,000	0,272	0,000	0,000	0,000										
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция																										
1.1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																										
1.1.1.1.	Объект 1																										
1.1.1.2.	Объект 2																										
1.2.	Электрические линии	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.2.1.	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от в.ч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Буцук" до ТП-32 п. Хивмань	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.2.2.	Выскаса кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №25 с территории ВКМ "Рухомаш"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.	Помещения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.1.	Уровень входного напряжения 110 кВ (ВН) ГПП 110/10 кВ "ЛАД"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.1.1.	Замена выключателей МКП-110 - 5шт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.1.2.	Замена аккумуляторных батарей СА-18-120 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.1.3.	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт. ГПП 110/10 кВ "Везуэт"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.1.4.	Замена отделителей и короткозамквателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.1.5.	Замена КРУН-10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.1.6.	Замена ВЧ заградителей - 4 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.1.7.	Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.1.8.	Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.2.	Уровень входного напряжения 1-20 кВ (СНЗ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.3.2.1.	Замена ТП-3301	0,259	0,000	0,000	0,000	0,272	0,000	0,000	0,000	-0,013	0,000	0,000	0,000	0,272	0,000	0,000	0,000										
1.4.	Оснащение специоборудованием, спецтехникой и приборами	0,259	0,000	0,000	0,000	0,272	0,000	0,000	0,000	-0,013	0,000	0,000	0,000	0,272	0,000	0,000	0,000										
1.4.1.	Приобретение ЭТЛ	0,259	0,000	0,000	0,000	0,272	0,000	0,000	0,000	-0,013	0,000	0,000	0,000	0,272	0,000	0,000	0,000										
1.5.	Создание системы противопожарной и релейной автоматики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.5.1.	Выскаса микропроцессорной релейной защиты, автоматы на ГПП 110/10 кВ "ЛАД"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.5.1.1.	Замена панелей защит 1636 и 1643 по 2 шт с ВЧ передатчиками	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.5.1.2.	Замена панелей защит силовых трансформаторов-2 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.5.1.3.	Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ-1 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.5.1.4.	Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.5.1.5.	Замена панелей центральной сигнализации - 1 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.5.1.6.	Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.5.2.	Внедрение микропроцессорной релейной защиты, автоматы на ГПП 110/10 кВ "Везуэт"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.5.2.1.	Замена панелей защит силовых трансформаторов-2 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.6.	Создание систем телемеханики и связи																										
1.7.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																										
1.7.1.	Объект 1																										
1.7.2.	Объект 1																										

С.А.



**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(представляется ежеквартально) 1 квартал 2016 г.**



№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)											
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.			
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	22.112	0.042	0.040	0.042	0.040	0.000	0.000	5.262	0.000	16.771	0.000	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	15.627	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.607	0.000	14.020	0.000	
1.1.1	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	15.627	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.607	0.000	14.020	0.000	
1.1.2	в т. ч. прибыль со свободного сектора	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.1.3	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.1.3.1	в т. ч. от технологического присоединения генерации	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.1.3.2	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.1.4	Прочая прибыль	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.2	Амортизация	2.820	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.820	0.000	0.000	0.000	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	2.820	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.820	0.000	0.000	0.000	
1.2.2	Прочая амортизация	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3	Возврат НДС	3.507	0.042	0.040	0.042	0.040	0.000	0.835	0.000	0.000	2.593	0.000	
1.4	Прочие собственные средства	0.158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.158	0.000	
1.4.1	в т. ч. средства дозачиски	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0.000											
2	Привлеченные средства, в т. ч.:	0.878	0.231	0.219	0.231	0.219	0.000	0.219	0.219	0.000	0.219	0.000	
2.1	Кредиты												
2.2	Облигационные займы												
2.3	Займы организаций												
2.4	Бюджетное финансирование												
2.5	Средства внешних инвесторов												
2.6	Использование лизинга	0.878	0.231	0.219	0.231	0.219	0.000	0.219	0.219	0.000	0.219	0.000	
2.7	Прочие привлеченные средства												
	<b>ВСЕГО источников финансирования для ОГК/ТЭК, в том числе</b>	<b>22.990</b>	<b>0.272</b>	<b>0.259</b>	<b>0.272</b>	<b>0.259</b>	<b>0.000</b>	<b>5.482</b>	<b>0.000</b>	<b>16.991</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
	ДПМ												
	вне ДПМ												

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой


\*\* Накопленным итогом за год





## Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально) 1 квартал 2016 года

Утверждаю  
Генеральный директор  
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"  
А.А. Голянин  
20 16 года  
М. П.

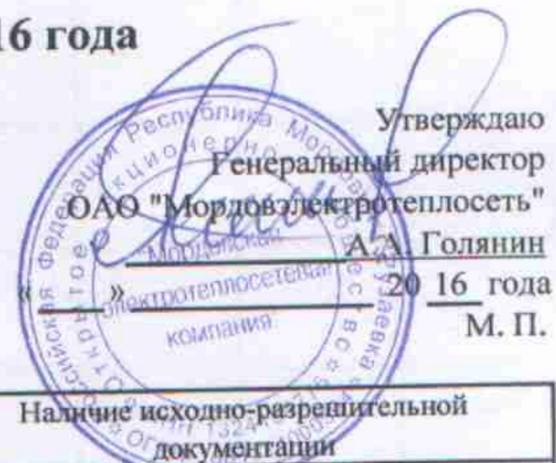

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>										
<b>Электрические линии</b>										
1	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш				2014	2016	-	-	-	-
2	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"				2016	2016	-	-	-	-
<b>Подстанции</b>										
4	Замена выключателей МКП-110 - 5 шт				2014	2017	+	-	-	-
5	Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт				2016	2016				
6	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт				2016	2016				
7	Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт				2016	2017				
8	Замена КРУН-10				2016	2017				
9	Замена ВЧ заградителей - 4 шт				2017	2017				
10	Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт				2017	2017				
11	Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт				2017	2017				
12	Замена ТП-3301				2017	2017				
13	Приобретение ЭТТЛ				2014	2017	-	-	-	-
14	Замена панелей защит 1636 и 1643 по 2 шт с ВЧ передатчиками				2016	2017	-	-	-	-
15	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт.				2016	2016				
16	Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт.				2016	2016				
17	Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт.				2016	2016				
18	Замена панели центральной сигнализации - 1 шт.				2016	2016				
19	Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт.				2016	2016				
20	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт.				2017	2017				
<b>Новое строительство и расширение, в т.ч.:</b>										



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ОАО "Мордовская электротеплосеть"  
 А.А. Голянин  
 2016 г.  
 М.П.

**ОТЧЕТ** Открытого акционерного общества "Мордовская электротеплосетевая компания"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики  
 за I квартал 2016 года  
 (дата составления) 2016 г.

В Министерстве энергетики и тарифной политики  
 Республики Мордовия

Таблица 1

№/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения* (2), %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения* (2)			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость* (3)	остаток* (4) на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I-IV кв.)	план* (3)	факт* (4)	остаток профинансировать по результатам отчетного периода* (4)	млн. руб. без НДС	из них за счет:		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>ВСЕГО:</b>					54.408	54.408	19.483	0.231	54.177	19.252	0.000	0.000	19.252	
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:					42.497	42.497	17.270	0.231	42.266	17.040	0.000	0.000	17.040	
1.1.	Электрические линии, в т.ч.:					5.735	5.735	0.680	0.000	5.735	0.680	0.000	0.000	0.680	
1	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ПП-32 п. Химмаш	2014-2016	2016			1.442	1.442	0.000	0.000	1.442	0.000			0.000	
2	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"	2016	2016			4.293	4.293	0.680	0.000	4.293	0.680			0.680	
1.2.	Подстанции, в т.ч.:					30.649	30.649	12.931	0.000	30.649	12.931	0.000	0.000	12.931	
	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)					30.139	30.139	12.931	0.000	30.139	12.931	0.000	0.000	12.931	
	ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"					14.639	14.639	8.254	0.000	14.639	8.254	0.000	0.000	8.254	
1	Замена выключателей МКП-110-5 шт	2014-2017	2015-2017			10.131	10.131	3.746		10.131	3.746	0.000	0.000	3.746	
2	Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт	2016	2016			3.449	3.449	3.449		3.449	3.449			3.449	





Таблица 2

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения* (2)		Причины отклонений
		План* (3)	Факт* (2)	млн. руб. без НДС	%	
	I	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	19.483	0.231	19.252	98.8	
A.	Собственные средства, в т.ч.:	18.605	0.000	18.605	100.0	
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	15.627	0.000	15.627	100.0	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	15.627		15.627		
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	15.627		15.627		
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение			0.000		
A.1.1.1.2.	инвестиционная составляющая в тарифе	15.627		15.627		
A.2.	Амортизационные отчисления	2.820	0.000	2.820	100.0	
A.3.	Прочие собственные средства	0.158		0.158		
A.3.1.	Наименование источника прочие денежные средства					
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0.000	0.000	0.000		
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства	0.000	0.000	0.000		
B.3.1.	Наименование источника					
B.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.	0.878	0.231	0.647	73.7	
Г.1.	Лизинг	0.878	0.231	0.647	73.7	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал* (5)					
Е.	Возврат инвестированного капитала* (5)					

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные

на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
